



Департамент образования Белгородской области
Управление образования администрации города Белгорода
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 1» г. Белгорода
имени героя Российской Федерации Антона Геннадьевича Копейкина

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ КНИГОВЫДАЧИ»

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Оптимизация книговыдачи

Общие данные: Заказчик: директор МАОУ «ЦО № 1» Ю.Б. Гребенников Процесс: Оптимизация работы библиотеки Границы процесса: запрос литературы, с запросом ознакомлен. Руководитель проекта: уч. математики Котельникова О.А. Команда проекта: зав. библиотекой Яцкевич И.В., программист Карамышев Д.С., зам. директора Амельченко М.Г.			Обоснование: 1. Повторяемый процесс, 2. Длительный процесс.		
Цели и эффекты:			Сроки реализации мероприятий проекта:		
Цели:			1. Старт проекта 11.09.2023г. 2. Анализ текущей ситуации (11.09.23-15.09.23г.) – разработка текущей ситуации (16.09.23 – 30.09.23г.) - поиск и выявление проблем (16.09.23 – 30.09.23г.) - разработка целевой карты процесса (1.10.23 – 15.10.23г.) - разработка «дорожной карты» (07.11.23 – 24.11.23г.) 3. Защита карточки проекта (27.11.23г.) 4. Внедрение улучшений (01.12.23 – 23.12.23г.) 5. Закрытие проекта (23.12.23г.)		
Наименование	Текущий показатель	Целевой показатель			
Время протекания процесса, мин	6-12мин	2-4мин			
Носитель информации	Материальный носитель	Электронный носитель			
Эффекты:					
1. Повышение удовлетворенности читателей;					
2. Сокращение временных затрат библиотекаря и читателей;					
3. Повышение прозрачности процесса;					
4. Совершенствование системы отчетности.					

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1	Гребенников Ю.Б.	Директор МАОУ «ЦО № 1»	Куратор проекта (заказчик)
2	Амельченко М.Г.	Заместитель директора МАОУ «ЦО № 1»	Администратор проекта
3	Котельникова О.А.	Учитель математики МАОУ «ЦО № 1»	Руководитель проекта
4	Яцкевич И.В.	Заведующая библиотекой МАОУ «ЦО № 1»	Исполнитель
5	Карамышев Д.С.	Программист МАОУ «ЦО № 1»	Исполнитель

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:

1. Учащиеся в течении перемены не успевают получить в библиотеке нужную литературу.
2. Нет возможности получить книгу альтернативным способом не приходя в библиотеку.
3. Большие затраты по времени для организации книговыдачи.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Карта текущего состояния «Выдача литературы»

Библиотекарь на совещании, идет мероприятие или есть посетители



Читатель
Идет в библиотеку
1 - 4 мин




Читатель
Делает запрос книги
10-15 сек



Библиотекарь
Ищет нужную книгу, делает запись в формуляр
4мин.- 6мин.

Необходимой книги нет в фонде библиотеки



Читатель
Получает книгу, расписывается в формуляре.
1 - 2 мин


Ожидает формуляр, если кто-то расписывается



Библиотекарь
Ставит формуляр на место
10 - 15 сек.




Исполнитель
Описание процесса
Время



Описание потерь

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

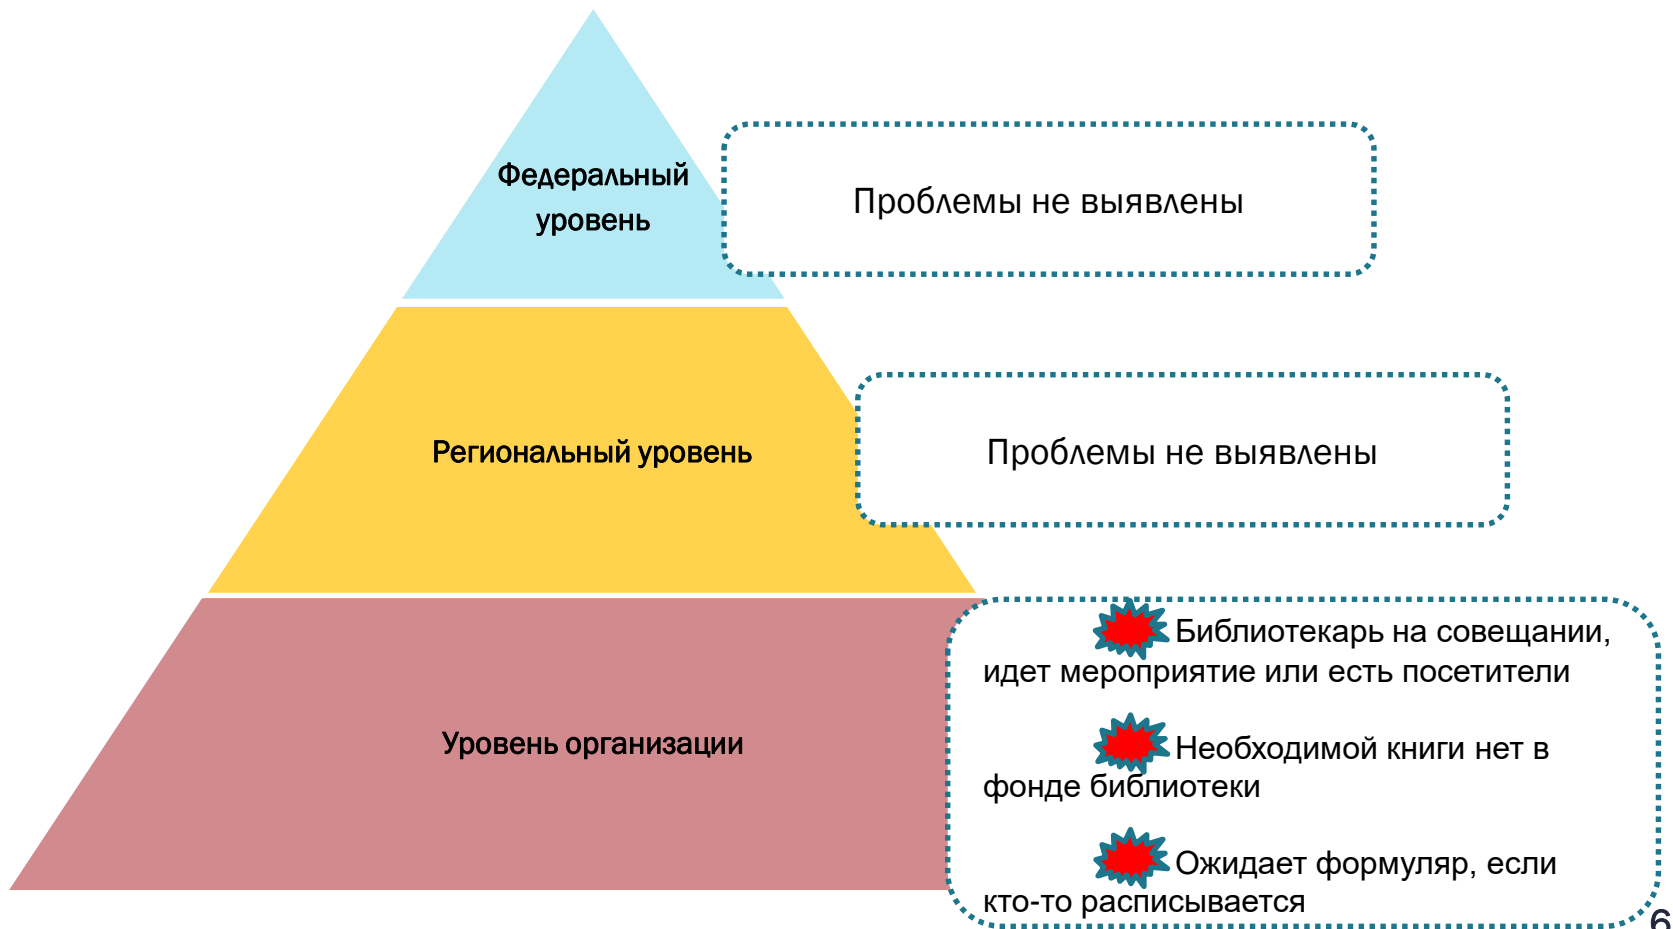


ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта текущего состояния «Выдача литературы»

Библиотекарь на совещании, идет мероприятие или есть посетители


Необходимой книги нет в фонде библиотеки

Ожидает формуляр если кто-то расписывается

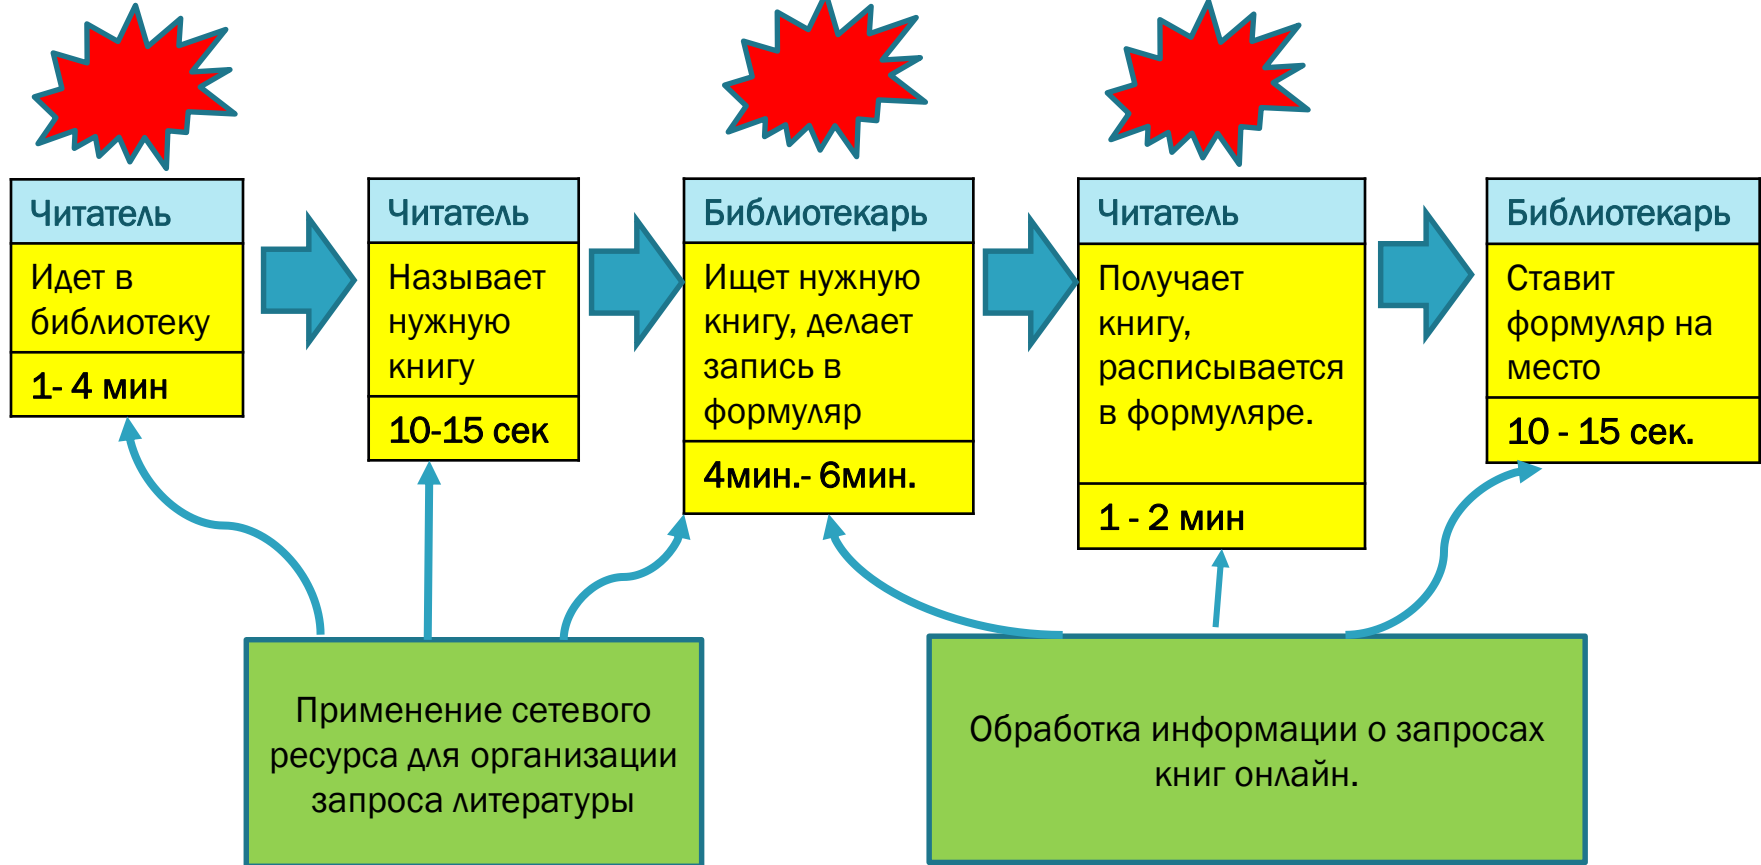

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта целевого состояния «Выдача литературы»

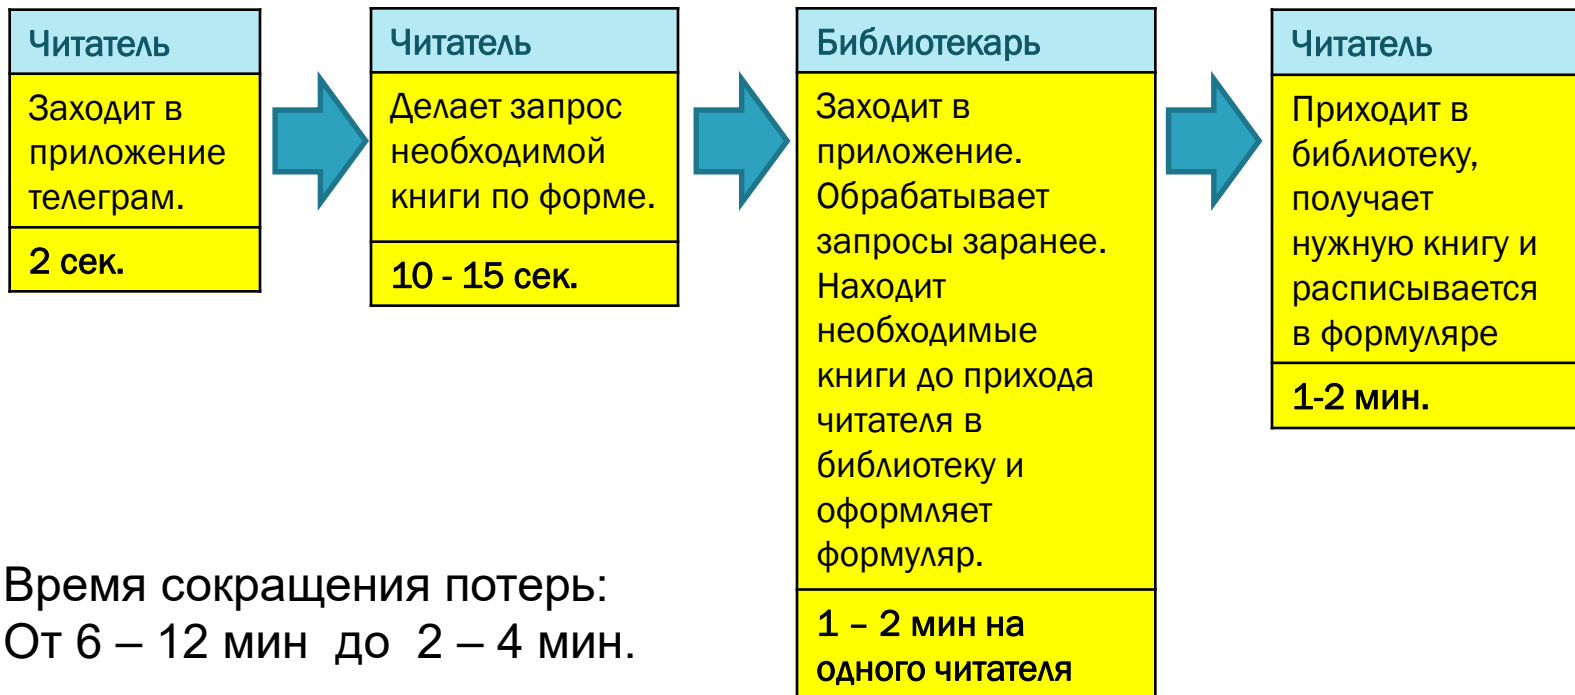

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<p>Цель проекта:</p>	<p>Цель проекта – сократить время работников библиотеки на поиск и выдачу литературы и сократить время читателей на получение необходимой литературы через перевод процесса в электронную форму к 23.12.2023г.</p>					
<p>Способ достижения цели:</p>	<p>Использование электронного ресурса для запроса необходимой литературы</p>					
<p>Результат проекта:</p>	<p>Результат:</p>	<p>Базовое значение</p>	<p>Период, год</p>			
	<p>Подключен электронный ресурс соответствующий целям проекта</p>		<p>23</p>	<p>12</p>	<p>23</p>	<p>г</p>
<p>Требования к результату проекта:</p>	<p>Требования к результату</p>	<p>Базовое значение</p>	<p>Период, год</p>			
	<p>Требования к результату проекта, которые будут учитываться при определении достижения данных результатов. Определяют качественные и количественные характеристики результата проекта в разрезе значений по годам реализации проекта с указанием базового значения</p>		<p>23</p>	<p>12</p>	<p>23</p>	<p>г</p>
	<p>Созданы условия для запроса необходимой литературы для всех читателей учреждения</p>	<p>40%</p>	<p>100%</p>			
	<p>Перевод запросов необходимой литературы по учреждению в электронный вид</p>	<p>0%</p>	<p>50%</p>			
	<p>Сокращение затрат по времени</p>	<p>12мин</p>	<p>4 мин</p>			
<p>Пользователи результатом:</p>	<p>Обучающиеся, педагоги</p>					

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало/ Окончание	2019 /2020			
				1 нед	2-3 нед	4-5 нед	6-7 нед
1.	Анализ текущей ситуации, поиск и выявление проблем.	5	11.09.2023-15.09.2023				
2.	Разработка текущей и целевой карты процесса.	15	16.09.2023-30.09.2023				
3.	Разработка формы для электронного запроса необходимой литературы.	15	01.10.2023-15.10.2023				
4.	Апробация электронного ресурса для запроса необходимой литературы.	15	16.10.2023-30.10.2023				
5.	Информирование читателей о возможности запроса литературы через электронный ресурс.	5	31.10.2023-04.11.2023				
Итого		55					

* *завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом*

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Котельникова О.А.

kot9082008@mail.ru
